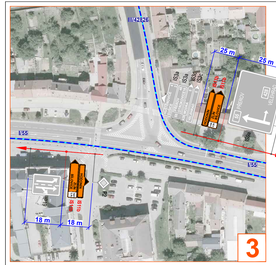

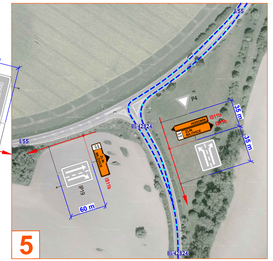

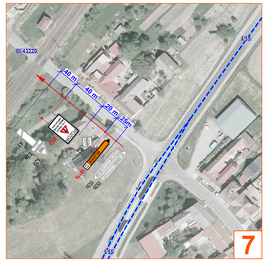







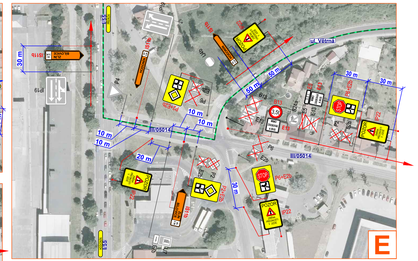

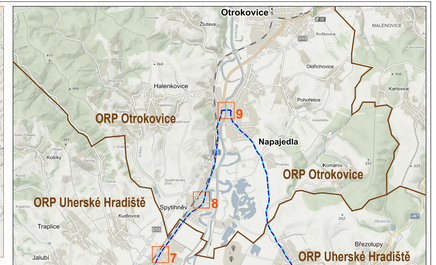

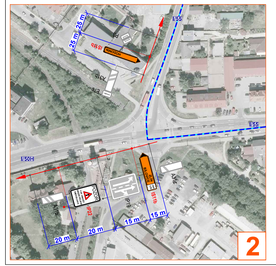

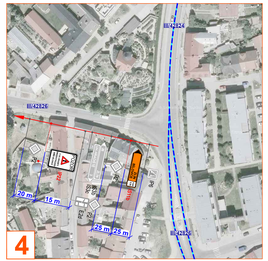

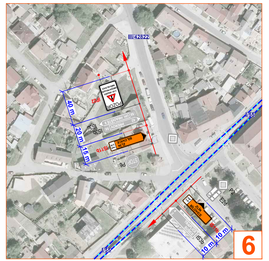

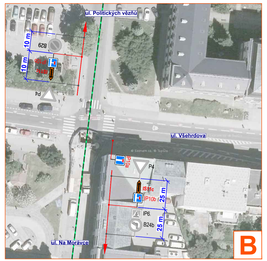



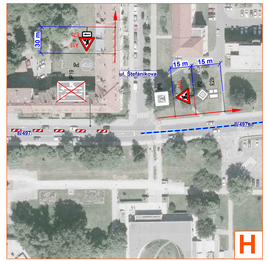

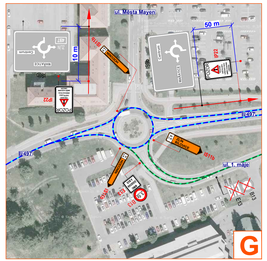

Legenda:

- pracovní místo - ETAPA 2
- navržená objízdná trasa
- navržená objízdná trasa pro vozidla nad 3,5t
- P2 - navržené přechodné svislé dopravní značení
- P2 - stávající svislé dopravní značení
- zrušené stávající svislé dopravní značení

Souhlasíme s přechodnou úpravou provozu, uzavírkou pozemní komunikace a navrženou objízdnou a stávajícími trasou.
V souladu s ustanovením § 36 odst. 3 písm. č. 500/2004 Sb. Správního řádu se vrátíme právní výklad/ů se k podkladům rozhodnutí.

Dopravní značení, které bude v rozporu a přechodným dopravním značením bude dočasně zakryto.
Přechodné dopravní značení (dále PDZ) na silnicích I. třídy bude provedeno v základní velikosti fólií tř. 2 (příp. tř. 3) a na pozemních komunikacích nižších tříd bude PDZ provedeno v základní velikosti fólií tř. 1. PDZ bude osazeno dle TP 66.

VYPRACOVAL	ZIMNA	
KONTROLOVAL	JANATA	
INVESTOR	ŘSD ČR, p.o.	
ZHOTOVITEL	SWIETELSKY, s.r.o.	
STAVBA	SILNICE I/55, KŘIŽOVATKA SE SILNICÍ I/49 U UHERSKÉ HRADIŠTĚ	
VÝKRES	DOPRAVNÍ INŽENÝRSKÁ OPATŘENÍ 1370 x 297	ETAPA 2 - OBLOŽENÉ TRASY
		DATUM 17. 2. 2021
PŘECHODNÁ ÚPRAVA PROVOZU		Nr. ZN. ZN-20-0008

NOVLINE
NOVLINE s.r.o.
Cukrovar 256
763 61 Napajedla
www.novline.cz
zhotovitelem IZ
MO ČTÍ SM ZÍS
